EXTENSION DU PARC MURE A IVRY SUR SEINE
Tranche - MARMONT
Calendrier prévisionnel enveloppe TCE
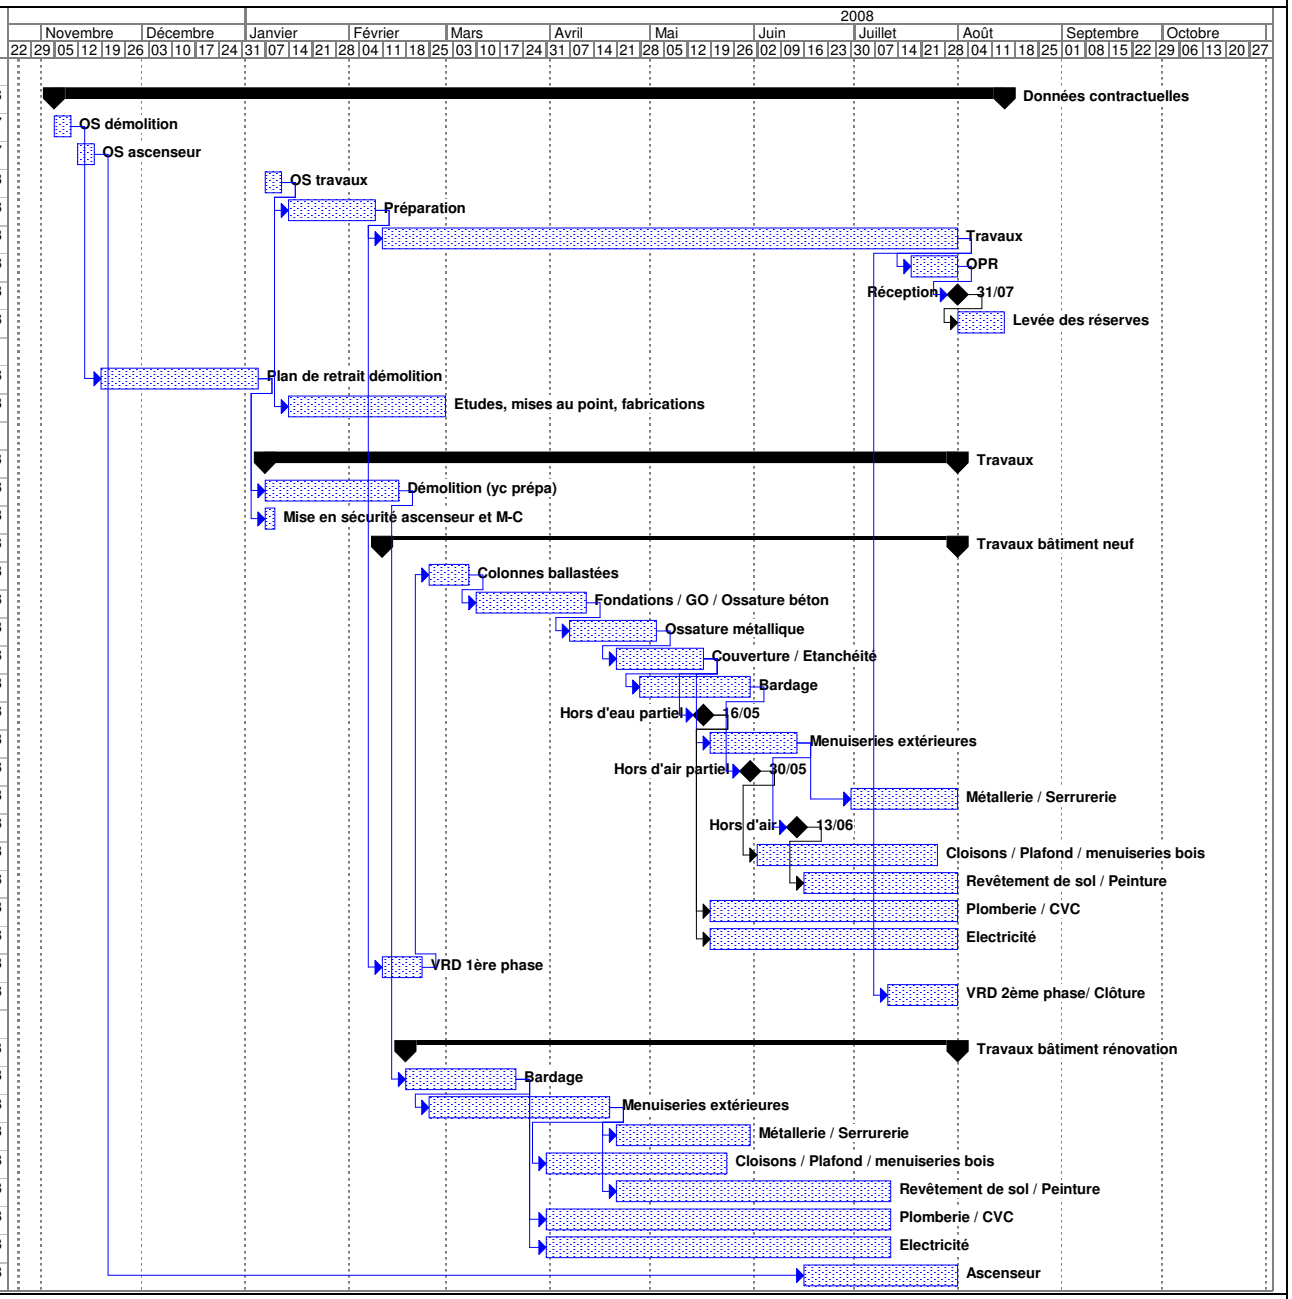
N°	Lots	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1					
2		**Données contractuelles**	**204 jours**	**Lun 05/11/07**	**Jeu 14/08/08**
3		OS démolition	5 jours	Lun 05/11/07	Ven 09/11/07
4		OS ascenseur	5 jours	Lun 12/11/07	Ven 16/11/07
5		OS travaux	5 jours	Lun 07/01/08	Ven 11/01/08
6		Préparation	20 jours	Lun 14/01/08	Ven 08/02/08
7		Travaux	124 jours	Lun 11/02/08	Jeu 31/07/08
8		OPR	10 jours	Ven 18/07/08	Jeu 31/07/08
9		Réception	0 jour	Jeu 31/07/08	Jeu 31/07/08
10		Levée des réserves	10 jours	Ven 01/08/08	Jeu 14/08/08
11					
12		Plan de retrait démolition	35 jours	Lun 19/11/07	Ven 04/01/08
13		Etudes, mises au point, fabrications	35 jours	Lun 14/01/08	Ven 29/02/08
14					
15		**Travaux**	**149 jours**	**Lun 07/01/08**	**Jeu 31/07/08**
16		Démolition (yc prépa)	30 jours	Lun 07/01/08	Ven 15/02/08
17		Mise en sécurité ascenseur et M-C	3 jours	Lun 07/01/08	Mer 09/01/08
18		**Travaux bâtiment neuf**	**124 jours**	**Lun 11/02/08**	**Jeu 31/07/08**
19	Lot 1	Colonnes ballastées	10 jours	Lun 25/02/08	Ven 07/03/08
20	Lot 1	Fondations / GO / Ossature béton	25 jours	Lun 10/03/08	Ven 11/04/08
21	Lot 2	Ossature métallique	20 jours	Lun 07/04/08	Ven 02/05/08
22	Lot 3	Couverture / Etanchéité	20 jours	Lun 21/04/08	Ven 16/05/08
23	Lot 3	Bardage	25 jours	Lun 28/04/08	Ven 30/05/08
24	Lot 3	Hors d'eau partiel	0 jour	Ven 16/05/08	Ven 16/05/08
25	Lot 4	Menuiseries extérieures	20 jours	Lun 19/05/08	Ven 13/06/08
26	Lot 4	Hors d'air partiel	0 jour	Ven 30/05/08	Ven 30/05/08
27	Lot 4	Métallerie / Serrurerie	24 jours	Lun 30/06/08	Jeu 31/07/08
28	Lot 4	Hors d'air	0 jour	Ven 13/06/08	Ven 13/06/08
29	Lot 5	Cloisons / Plafond / menuiseries bois	40 jours	Lun 02/06/08	Ven 25/07/08
30	Lot 6	Revêtement de sol / Peinture	34 jours	Lun 16/06/08	Jeu 31/07/08
31	Lot 7	Plomberie / CVC	54 jours	Lun 19/05/08	Jeu 31/07/08
32	Lot 8	Electricité	54 jours	Lun 19/05/08	Jeu 31/07/08
33	Lot 9	VRD 1ère phase	10 jours	Lun 11/02/08	Ven 22/02/08
34	Lot 9	VRD 2ème phase/ Clôture	15 jours	Ven 11/07/08	Jeu 31/07/08
35					
36		**Travaux bâtiment rénovation**	**119 jours**	**Lun 18/02/08**	**Jeu 31/07/08**
37	Lot 3	Bardage	25 jours	Lun 18/02/08	Ven 21/03/08
38	Lot 4	Menuiseries extérieures	40 jours	Lun 25/02/08	Ven 18/04/08
39	Lot 4	Métallerie / Serrurerie	30 jours	Lun 21/04/08	Ven 30/05/08
40	Lot 5	Cloisons / Plafond / menuiseries bois	40 jours	Lun 31/03/08	Ven 23/05/08
41	Lot 6	Revêtement de sol / Peinture	60 jours	Lun 21/04/08	Ven 11/07/08
42	Lot 7	Plomberie / CVC	75 jours	Lun 31/03/08	Ven 11/07/08
43	Lot 8	Electricité	75 jours	Lun 31/03/08	Ven 11/07/08
44		Ascenseur	34 jours	Lun 16/06/08	Jeu 31/07/08
